






INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	26/08/2019										
Fecha Suscripción del Contrato:	22/12/2017										
Contrato No:	065-2017										
Nombre del Contratista:	Sertic Mayorista										
Nit o CC del Contratista:	900 336 798-6										
Objeto del Contrato:	Adquisición, instalación y configuración de la infraestructura Tecnológica para asegurar el acceso de red de nuevos puestos de trabajo en cada una de sus sucursales que se necesiten en la SAE SAS.										
Valor del Contrato:	36.176.000										
Adición:											
Plazo:	8 meses										
Prórrogas:	8 meses										
Periodo de evaluación del informe:	Agosto										
Obligaciones cumplidas por el contratista:		<p>Los equipos adquiridos deberán ser entregados, instalados y configurados en la sucursal que en su momento la SAE especifique.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>El contratista realiza la entrega de un switch HP 1950 S/N CN93GQVOJ7, en la Calle 93 el día 29 de mayo y se realizó instalación y configuración el día 22 de junio.</p> <p>El contratista realiza la entrega dos (2) tarjetas SNMP de las UPS de Calle 96 y Cali 3 piso con pruebas de monitoreo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubicación</th> <th>Capacidad</th> <th>Serial</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calle 96</td> <td>20 KVA</td> <td>890201708100021</td> </tr> <tr> <td>Cali</td> <td>10 KVA</td> <td>180801-23280025</td> </tr> </tbody> </table>	Ubicación	Capacidad	Serial	Calle 96	20 KVA	890201708100021	Cali	10 KVA	180801-23280025
	Ubicación	Capacidad	Serial								
Calle 96	20 KVA	890201708100021									
Cali	10 KVA	180801-23280025									
	<p>El tiempo máximo de entrega de los equipos una vez allá sido solicitado por parte de la SAE SAS, es de cuatro (4) días.</p> <p>OBSERVACIONES:</p> <p>El contratista realiza la entrega de los equipos fuera de los 4 días por disponibilidad, se llego a acuerdo para la entrega en otras fechas.</p>										

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

		<ul style="list-style-type: none"> El proveedor deberá hacer entrega de las garantías de los equipos adquiridos, la cual debe ser por un (1) año y deberá cubrir cualquier daño ocurrido sobre los mismos, sin que la SAE incurra en costos adicionales. <p>OBSERVACIONES:</p> <p>El contratista realiza la entrega de un informe donde se evidencia la garantía de los equipos entregados.</p>
<p>Porcentaje de Ejecución y Avances:</p>	<p>100%</p>	
<p>Cumplimiento pago de Parafiscales:</p>	<p>Periodo de agosto 2019</p>	
<p>Certificación de Cumplimiento:</p>	<p>El contratista cumple en su totalidad las obligaciones de pagos a parafiscales durante el periodo de agosto 2019</p>	


 Firma Supervisor





Bogotá Junio 21 de 2019

SEÑORES:
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
Edwin Alfonso Cortes Barrera
Técnico I
Oficina de Gestión de la Información
Ciudad.


REF: INFORME TECNICO CONTRATO 065-2017
Instalación Switch HP 1950

Apreciados Señores:

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del switch de Switch HP 1950 del contrato en referencia, presentamos información técnica.

Tareas Realizadas:

Se da conectividad e ingreso al Switch HP 1950 por consola y se configura para poder ingresar de modo GUI por el navegador de Google, con la IP 169.254.239.126

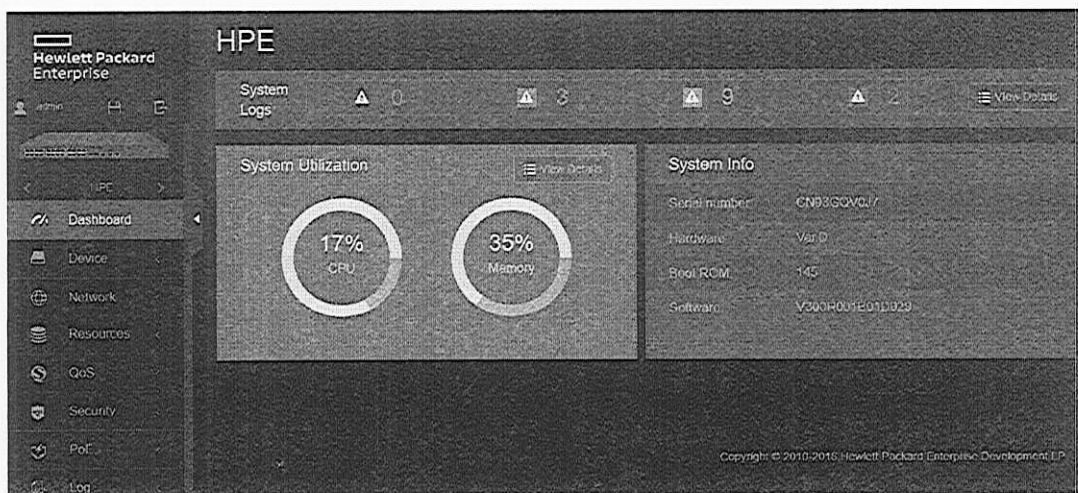

Cra 10 No 97 A - 13 Torre B Ofi 202 Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (571) 7 42 8496

SERTIC MAYORISTA S.A.S

www.serticmayorista.com



Al tener gestión y control Web empiezan las configuraciones de las Vlan's y control de él en puerto 24 Vlan 74 (gestión) con la 172.30.74.3 / 24 y se cambian todos los demás Puertos a esta VLAN, se hace pruebas en el dominio y la red.

VLAN	Untagged Port List	Tagged Port List	IP address of the VLAN interf.	Description
74	23	2 GE1/0/24 XGE1/0/28	172.30.74.3/255.255.255.0	VLAN 0074

Total 4 entries, 1 selected.

Estado Final:

Se deja instalado en el Rack de comunicaciones, conectado con los cables de red.

Probado y Funcionando, con conectividad hacia todos los equipos de la Oficina.

Cualquier duda adicional con gusto la resolveremos.

Cordialmente,

LINA MARCELA QUEBRADA
GERENTE GENERAL
SERTIC MAYORISTA S.A.S.
Nuevo PBX 57 1 7428496 Celular 3102445252
email: mquebrada@serticmayorista.com
www.serticmayorista.com

Cra 10 No 97 A - 13 Torre B Ofi 202 Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (571) 7 42 8496
SERTIC MAYORISTA S.A.S
www.serticmayorista.com



Bogotá 6 de Junio de 2019

Señores:
SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE
Atn. ING. EDWIN CORTES
Ciudad.-

REF: GARANTIAS DE SWITCH

Apreciados Señores:

Nos permitimos informar los tiempos que cubre las garantías contra defectos de fabricación de los productos entregados, de acuerdo con el contrato No.065 de 2017

ITEM	DESCRIPCION	GARANTIA
1	Un (1) Switch HP 1950-24G N/P JG962A S/N CN93GQVJ7	Limitada de por Vida a partir del día Lunes 29 de Mayo de 2019. Directamente con Fabricante: https://www.arubanetworks.com/support-services/contact-support/ Teléfono 6004150

Cualquier duda con gusto la resolveremos

Cordialmente,

LINA MARCELA QUEBRADA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERTIC MAYORISTA S.A.S.
PBX 57 1 7428496 Celular 3102445252
email: mquebrada@serticmayorista.com
mquebrada@sertic.co
